

(仮称)沖縄伊武部ビーチホテル計画防災工事 平成29年1月の工事のお知らせ

工種	1月																															記事		
	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日	17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日			
共通仮設工				準備工(看板設置・基本測量他)			仮事務所ヤード整地・設置																											
給排水・電気設備																																		
伐採工																																		
オカヤドカリ侵入防止柵																																		
磁気探査工																																		
濁水処理設備設置工																																		
浸透池補修工																																		
汚濁防止膜設置工																																		

平成29年1月の工事についてのお知らせ

工事名称 : (仮称) 沖縄伊武部ビーチホテル計画防災工事
 工事場所 : 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真2198番地1
 工事期間 : 平成29年1月04日～平成29年3月31日
 作業時間 : 午前8時～午後6時(前後1時間は片付)
 休 工 日 : 日曜日

○前田・國場JVの1月の予定


- ・仮事務所のヤード造成、伐採伐根およびオカヤドカリ侵入防止柵設置を行います。
- ・工事車両出入口には、交通誘導員を配置する予定です。
- ・ヤード造成および伐採伐根に関しては、重機による作業を行います。
- ・資機材の搬入に関しては、仮事務所・濁水プラントおよび重機の搬入予定です。
- ・伐採材の搬出については、1/16以降に大型車両で1～3台/日の予定です。
(工事の進捗に応じて、搬出日・台数が変わりますので、ご了承願います。)
- ・各関係会社への指導を徹底実施し、徐行、一旦停止等厳守し安全運転の走行に努める様に指導いたします。

※ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡下さい。

【連絡先】

前田建設工業・國場組建設工事共同企業体
 (仮事務所) 沖縄県名護市為又773-1 プロフィット為又502号室
 TEL : 0980-54-8575 FAX : 0980-54-2040
 土木所長 : 江頭俊郎

防災工事平面図

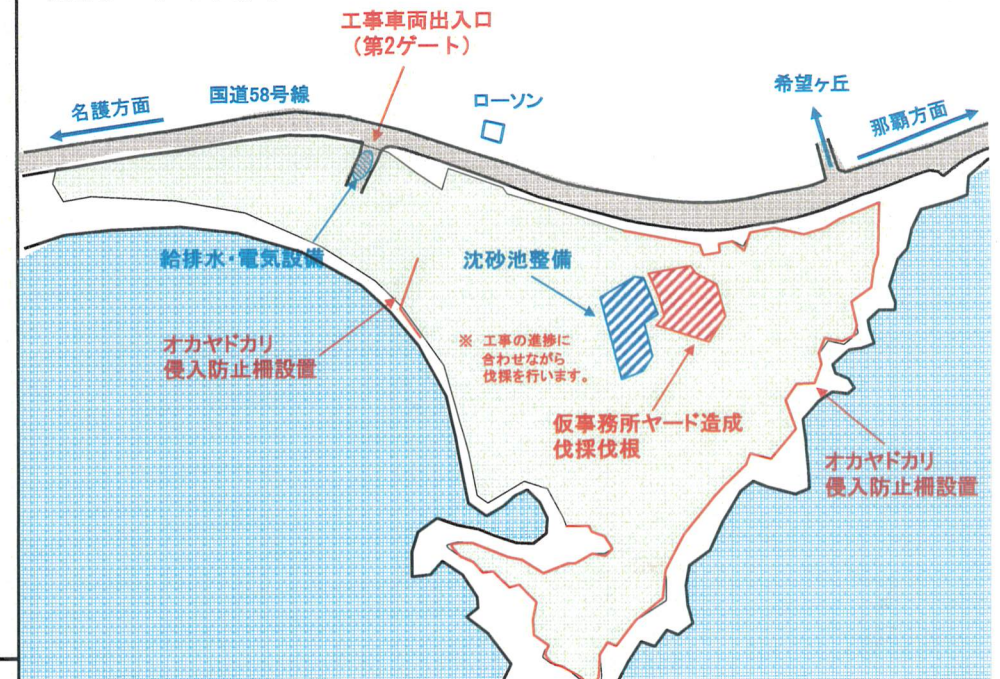

(仮称)沖縄伊武部ビーチホテル計画防災工事 平成29年2月の工事のお知らせ

工種	2月																												記事	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火		
共通仮設工																													本事務所設置 大型車両:4台/25tRC:2日	
仮設給排水・電気設備	場内電気配線					給水設備(水道引込)					場内配線・配管整備																			
伐採工	伐採・抜根・集積					伐採材搬出 大型車両:3台/日																								
磁気探査工	水平探査 4,000m ² /日																													
工事用道路・施工面整備						施工面整備(掘削・運搬)					路盤工 砕石:10tDT搬入 20台/日																			
仮設補修	小堤工整備、防護柵設置																													
既設擁壁撤去						撤去・集積					積込・搬出・処分 大型車両:3台/日																			
既設排水管撤去	撤去・集積									積込・搬出・処分 大型車両:2台/日																				
濁水処理設備設置													濁水プラントヤード整地					濁水プラント設置 大型車両:4台/25tRC:2日												

平成29年2月の工事についてのお知らせ

工事名称： (仮称) 沖縄伊武部ビーチホテル計画防災工事
 工事場所： 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真2198番地1
 工事期間： 平成29年1月04日～平成29年3月31日
 作業時間： 午前8時～午後6時 (前後1時間は片付)
 休 工 日： 日曜日

○前田・國場JVの2月の予定

- ・オカヤドカリ侵入防止柵設置の設置が完了しました。
- ・伐採伐根に関しては、重機による作業、大型車両による搬出を行います。(伐採材は、2/6以降に大型車両で3台/日の予定です。)
- ・2月より、磁気探査を開始し、完了した範囲から施工面の土工事を開始します。
- ・土工事と合わせ、工事用道路の整備及び資材置場の整備として、砕石を搬入します。(砕石搬入は10tDTにより、2/13より20台/日を予定しています。)
- ・その他、大型車両の搬出入として、既設擁壁撤去のコン殻を搬出する予定です。(コン殻搬出は、2/10より4,5台/日の予定です。)


※天候、工事の進捗により、搬出日・台数が変わりますので、ご了承ください。

※ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡下さい。

【連絡先】

前田建設工業・國場組建設工事共同企業体
 (仮事務所) 沖縄県名護市為又773-1 プロフィット為又502号室
 TEL: 0980-54-8575 FAX: 0980-54-2040
 土木所長: 江頭俊郎

防災工事平面図

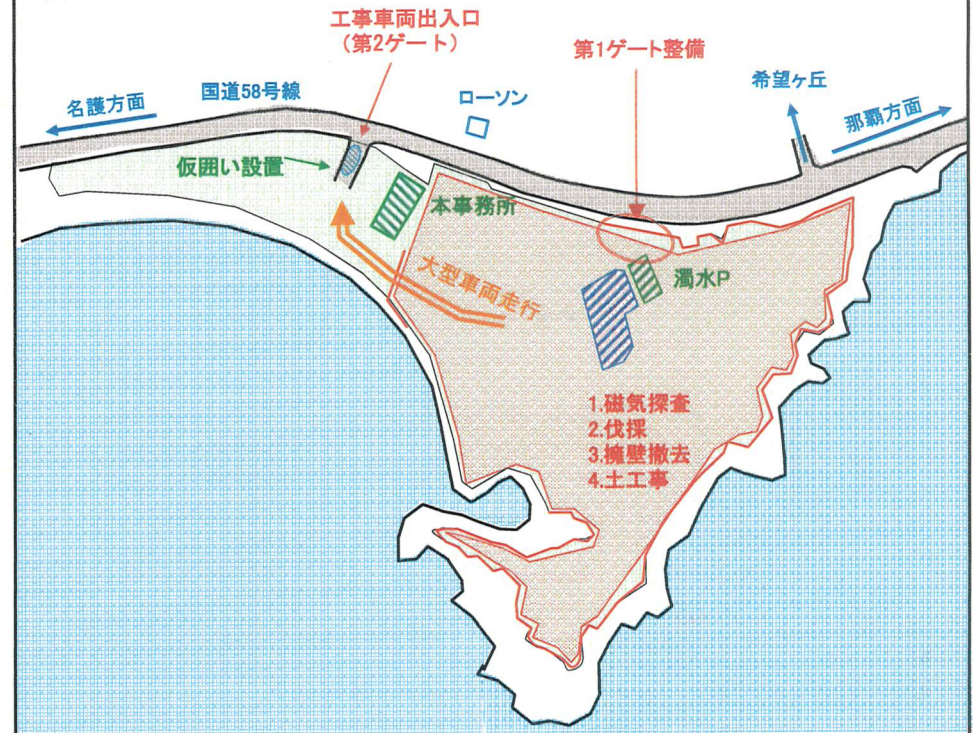

(仮称)沖縄伊武部ビーチホテル計画防災工事 平成29年3月の工事のお知らせ

工種	3月																															記事
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
共通仮設工	東側隣地移移				本事務所設置													備品搬入														
仮設給排水・電気設備	場内電気・給排水設備				25tR/C搬入 10t車:2.3台/日													本事務所電気設備・給排水設備														
工事用道路・施工面整備	施工面土工事/路盤工				砕石:10tDT搬入 30台/日													砕石:10tDT搬入 30台/日														
舗装工					舗装工(工事用道路、資材ヤード) アスファルト合材:10tDT搬入 5台/日													アスファルト合材:10tDT搬入 20台/日														
敷鉄板(クレーン走行路)					クレーン搬入 25tR/C搬入													鉄板設置 鉄板:トレーラー搬入 8台/日														
仮設維持・補修	沈砂池・小堤工・防護柵整備、維持・補修																															
既設擁壁撤去	撤去・集積/搬出・処分 大型車両:5台/日																															
既設排水管撤去	撤去・集積/搬出・処分 大型車両:5台/日				積込・搬出・処分																											
汚水対策(仮設浄化槽)														浄化槽設置(45人/150人槽)																		

平成29年3月の工事についてのお知らせ

工事名称： (仮称) 沖縄伊武部ビーチホテル計画防災工事
 工事場所： 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真2198番地1
 工事期間： 平成29年1月04日～平成29年3月31日
 作業時間： 午前8時～午後6時 (前後1時間は片付)
 休 工 日： 日曜日


○前田・國場JVの3月の予定

- ・3月は工事用道路(舗装)、クレーン走行路(敷鉄板)の整備がメインとなります。
- ・砕石及びアスファルト合材の搬入により、10t DTが初旬に30台/日、中旬頃には最大50台前後の搬入があります。
- ・13日頃より敷鉄板を搬入し(トレーラー:8台/日)、クレーンによる設置を行います。
- ・撤去材の搬出では、中旬まで、大型車両:5～10台/日の搬出を行います。
(天候、工事の進捗により、搬出日・台数が変わりますので、ご了承ください。)
- ・3月7日から、本事務所設置の為、クレーン及び10t車が7台入ります。
- 3月中旬頃には、大型車両の搬入が最大で70台程度を予定しております。ガードマンの誘導、運転手への指導等を徹底し、交通災害の防止に努めます。

※ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡下さい。

【連絡先】

前田建設工業・國場組建設工事共同企業体
 (仮事務所) 沖縄県名護市為又773-1 プロフィット為又502号室
 TEL: 0980-54-8575 FAX: 0980-54-2040
 土木所長: 江頭俊郎

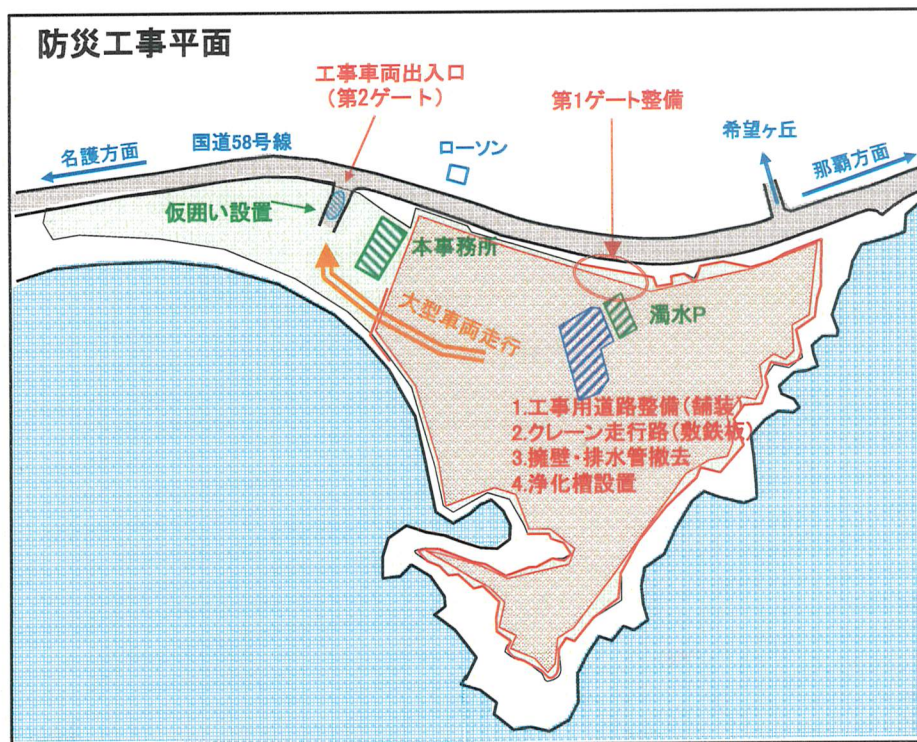

(仮称)沖縄伊武部ビーチホテル計画 平成29年5月の工事のお知らせ

工種	5月																															記事									
	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	13月	14日	15月	16月	17月	18月	19月	20月	21日	22月	23月	24月	25月	26月	27月	28日	29月	30月	31日										
【仮設工事】																																									
防災工	粉塵防止剤吹付			防災設備補修										維持管理										維持管理																	
場内整備	場内通路整備			安全設備整備										安全整備整備										安全整備整備																	
【準備工事】																																									
工事事務所エリア	室内作業			ゴールデンウィーク										室内作業										室内作業																	
【不発弾探査】																																									
ビーチフロントエリア	ビーチフロントエリア			ゴールデンウィーク										ビーチフロントエリア										ビーチフロントエリア																	
【山留工事】																																									
ヒルトップエリア																							70tクレーン・25tクレーン搬入 10t車搬入 1~4台/日								ヒルトップエリア										
【杭工事】																																									
準備工事	準備工事			ゴールデンウィーク										準備工事										本杭打設																	
ビーチフロントエリア				杭打機搬入・組立 90tクレーン搬入										試験杭・本杭打設										大型車両搬出入 20台/日																	

平成29年5月の工事についてのお知らせ

工事名称： (仮称) 沖縄伊武部ビーチホテル計画
 工事場所： 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真下袋原1967番地1外
 工事期間： 平成29年4月1日～平成31年4月30日
 作業時間： 原則として、午前8時～午後7時（前後1時間は片付）


○前田・國場JVの5月の予定

- 5月の主な作業は、準備工事、防災工事、仮設工事、不発弾探査、杭工事、山留工事です。
- ・杭工事準備のため、5月10日(2台)と5月11日(1台)の夜間(22:00～03:00の間の1時間程度)に杭打機の搬入を行います。(搬入車両が特殊車両の為、行政指導により夜間しか走行出来ない為、夜間搬入となります。)
- ・5月10日から5月12日まで大型車両、5～10台/日にて杭工事の資材搬入を行います。
- ・5月15日以降、杭打設の為、生コン車、20台/日にて生コンの搬入を行います。
- ・山留工事準備のため、5月22日(1台)の夜間(22:00～03:00の間の1時間程度)に大型クレーンの搬入を行います。(搬入車両が特殊車両の為、行政指導により夜間しか走行出来ない為、夜間搬入となります。)
- ・5月23日から10t車、1～2台/日にて山留資材の搬入を行います。
- ・(天候、工事の進捗により、搬出日・車両・台数が変わることがありますので、ご了承ください。)
- 車両の搬出入は、ガードマンにより歩行者・一般車両を優先とした誘導と運転手への指導を徹底し、交通災害の防止に努めます。
- 毎週月曜日・木曜日はビーチ、前面道路の清掃活動を実施します。

※ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡下さい。

【連絡先】

前田・國場 建設工事共同企業体 伊武部ビーチ作業所
 (JV事務所) 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2198番地1
 TEL: 098-967-7455 FAX: 098-967-7457
 安全担当: 窪田 琢郎 事務担当: 後藤 正樹

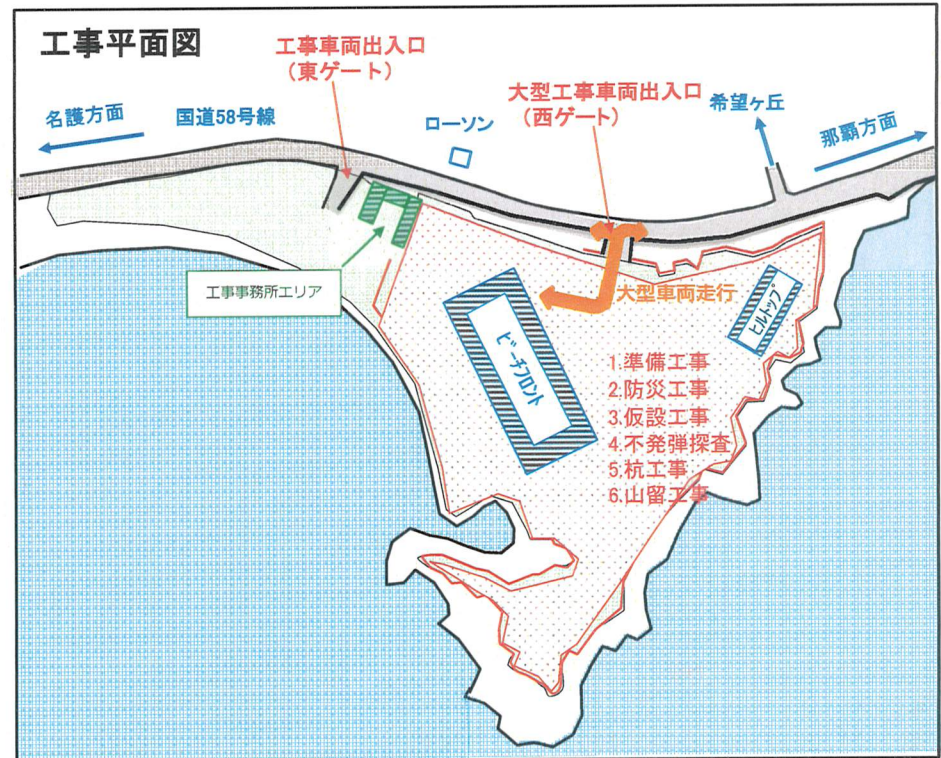

(仮称)沖縄伊武部ビーチホテル計画 平成29年6月の工事のお知らせ

工種	6月																														記事
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	
【仮設工事】	ヒルトップS4棟地足場組立																		ヒルトップS3棟地足場組立												
【杭工事】 1号機	ビーチフロント E2棟 場所打ちコンクリート杭打設 (1号機)																														
2号機	ビーチフロント E2棟 場所打ちコンクリート杭打設 (2号機)																														
3号機	ビーチフロント 3号機搬入・組立																		E1棟 場所打ちコンクリート杭打設 (3号機)												
【山留工事】	ヒルトップ S4棟親杭打設				ヒルトップ S3棟親杭打設																										
【土工事】	ヒルトップ S4棟掘削・土止め・砕石敷き・捨CON																		ヒルトップ S3棟掘削・土止め・砕石敷き・捨CON												
【基礎躯体工事】																			ヒルトップ S4 棟底盤・柱配筋・止め型枠												
																			ヒルトップ S3 棟底盤・柱配筋												
【擁壁工事】																			ヒルトップ 1・2・3・15号擁壁工事												
【外構・植栽工事】																			敷地周囲植栽剪定・場内樹木移植												
搬入・その他	大型車両搬出入 40台/日				夜間搬入あり				大型車両搬出入 40台/日				大型車両搬出入 60台/日				大型車両搬出入 60台/日				大型車両搬出入 60台/日										

平成29年6月の工事についてのお知らせ

工事名称： (仮称) 沖縄伊武部ビーチホテル計画
 工事場所： 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真下袋原1967番地1外
 工事期間： 平成29年4月1日～平成31年4月30日
 作業時間： 原則として、午前8時～午後7時 (前後1時間は片付)


○前田・國場JVの6月の予定

- 6月の主な作業は、仮設工事、杭工事、山留工事、土工事、基礎躯体工事、擁壁工事です。
 - ・杭工事準備のため、6月5日～7日の夜間(22:00～03:00の間の1時間程度)に杭打機・副資材の搬入を行います。状況により時間が変更になることがあります。
(搬入車両が特殊車両の為、行政指導により夜間しか走行出来ない為、夜間搬入となります。)
 - ・杭打設の為、杭打機1台につき20台/日程度、生コン車の搬入を行います。
 - ・基礎躯体工事、擁壁工事に伴い、大型車両による資材搬入が40～60台程度/日あります。
 - ・天候や工事の進捗により、工事内容や搬出入日・車両・台数が変わることがあります。
- 車両の搬出入は、ガードマンにより歩行者・一般車両を優先とした誘導と運転手への指導を徹底し、交通災害の防止に努めます。
- 工事は低騒音型の機械を使用し、騒音に留意して作業を行います。
- 工事ゲートのガードマンにより、第三者が誤って現場内に入場しないよう管理します。
- 毎週月曜日・木曜日はビーチ、前面道路の清掃活動を実施します。

※ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡下さい。

【連絡先】

前田・國場 建設工事共同企業体 伊武部ビーチ作業所
 (JV事務所) 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2198番地1
 TEL: 098-967-7455 FAX: 098-967-7457
 安全担当: 窪田 琢郎 事務担当: 後藤 正樹

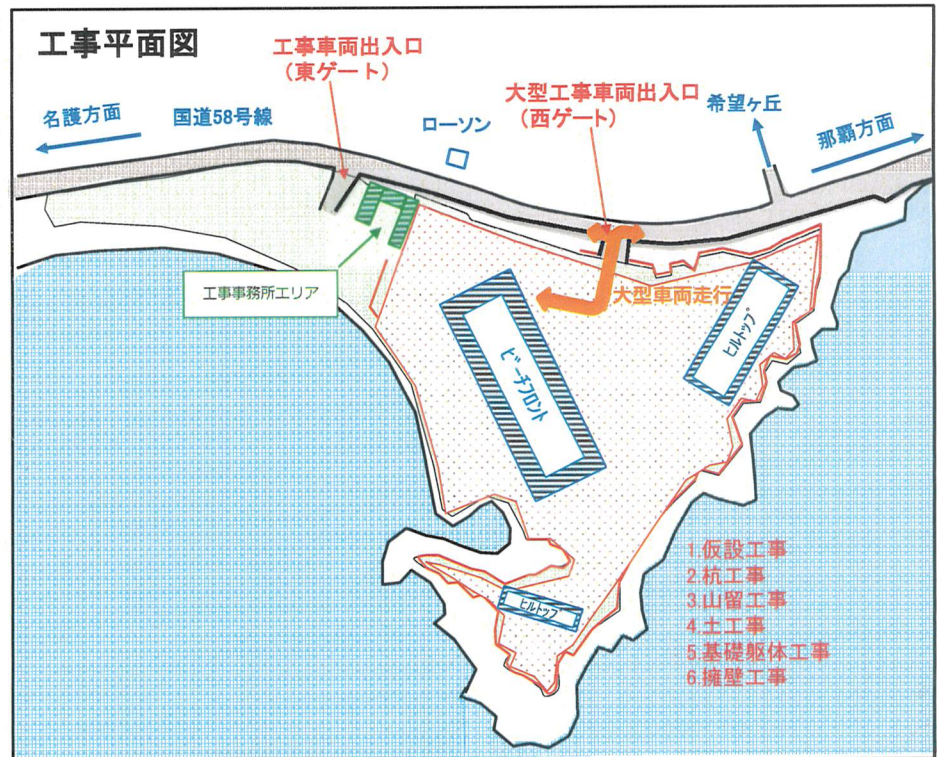

(仮称)沖縄伊武部ビーチホテル計画 平成29年7月の工事のお知らせ

工種	7月																															記事
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	
1.【仮設工事】					ヒルトップS4棟足場組立										ヒルトップS3棟足場組立					ヒルトップS4棟B1階足場組立									ヒルトップS2棟足場組立			
2.【杭工事】																																
ビーチフロント E1棟																																
ビーチフロント E2棟																																
ビーチフロント E3棟																																
ヒルトップ N1棟																																
3.【土工事】																																
ヒルトップ S2棟掘削・土止め・砕石敷き・捨CON																																
ヒルトップ S1棟掘削・土止め・砕石敷き・捨CON																																
4.【基礎躯体工事】																																
ヒルトップ S4棟 基礎配筋、柱配筋、型枠、底盤CON																																
ヒルトップ S3棟 基礎配筋、柱配筋、型枠																																
5.【擁壁工事】																																
ヒルトップ 1・2・15号擁壁工事																																
搬入・その他																																

平成29年7月の工事についてのお知らせ

工事名称： (仮称) 沖縄伊武部ビーチホテル計画
 工事場所： 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真下袋原1967番地1外
 工事期間： 平成29年4月1日～平成31年4月30日
 作業時間： 原則として、午前8時～午後7時（前後1時間は片付）

○前田・國場JVの7月の予定


- 7月の主な作業は、仮設工事、杭工事、土工事、基礎躯体工事、擁壁工事です。
 - ・7月3日～5日の夜間(22:00～03:00の間の1時間程度)に杭打機・副資材の搬入を行います。状況により時間に変更になることがあります。(搬入車両が特殊車両の為、行政指導により夜間しか走行出来ない為、夜間搬入となります。)
 - ・杭工事、基礎躯体工事、擁壁工事に伴い、大型車両による資材搬入が80～100台程度/日あります。
 - ・天候や工事の進捗により、工事内容や搬入日・車両・台数が変わることがあります。
 - ・熱中症対策で昼休憩を多くし、夕方の作業とする為、午後8時頃まで作業することがあります。
- 車両の搬出入は、ガードマンにより歩行者・一般車両を優先とした誘導と運転手への指導を徹底し、交通災害の防止に努めます。
- 工事は低騒音型の機械を使用し、騒音に留意して作業を行います。
- 工事ゲートのガードマンにより、第三者が誤って現場内に入場しないよう管理します。
- 毎週月曜日・木曜日はビーチ、前面道路の清掃活動を実施します。

※ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡下さい。

【連絡先】

前田・國場 建設工事共同企業体 伊武部ビーチ作業所
 (JV事務所) 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2198番地1
 TEL：098-967-7455 FAX：098-967-7457
 安全担当：窪田 琢郎 事務担当：後藤 正樹

工事平面図

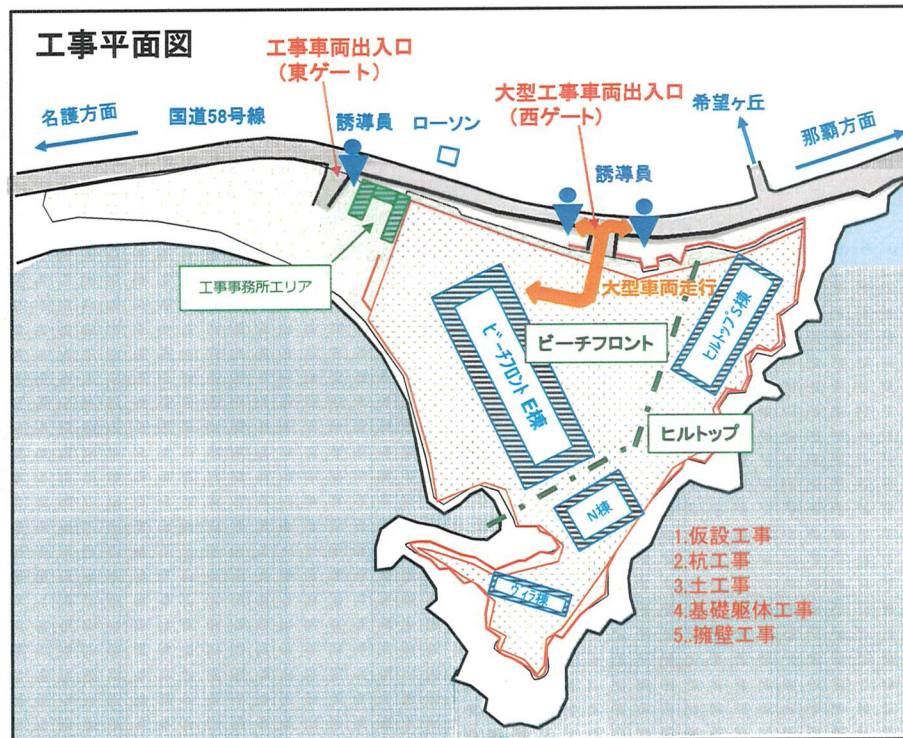

(仮称)沖縄伊武部ビーチホテル計画 平成29年8月の工事のお知らせ

工種	8月																															記事	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木		
1.【仮設工事】			ヒルトップS4棟足場組立				ヒルトップS3棟足場組立																								ヒルトップS2棟足場組立		
2.【杭工事】																																	
ビーチフロント E1棟																																	
ビーチフロント E3棟																																	
ヒルトップ																																	
3.【土工事】																																	
4.【基礎躯体工事】																																	
5.【擁壁工事】																																	
搬入・その他																																	


平成29年8月の工事についてのお知らせ

工事名称 : (仮称) 沖縄伊武部ビーチホテル計画
 工事場所 : 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真下袋原1967番地1外
 工事期間 : 平成29年4月1日～平成31年4月30日
 作業時間 : 原則として、午前8時～午後7時(前後1時間は片付)

○前田・國場JVの8月の予定

- 8月の主な作業は、仮設工事、杭工事、土工事、杭頭はつり工事、基礎躯体工事、擁壁工事です。
 - ・8月4日～18日の夜間(22:00～03:00の間の1時間程度)に杭打機・副資材の搬出入を行います。状況により時間が変更になることがあります。(搬入車両が特殊車両の為、行政指導により夜間しか走行出来ない為、夜間搬入となります。)
 - ・杭工事、基礎躯体工事、擁壁工事に伴い、大型車両による資材搬入が80～100台程度/日あります。
 - ・天候や工事の進捗により、工事内容や搬出入日・車両・台数が変わることがあります。
 - ・熱中症対策で昼休憩を多くし、夕方の作業とする為、午後8時頃まで作業することがあります。
- 車両の搬出入は、ガードマンにより歩行者・一般車両を優先とした誘導と運転手への指導を徹底し、交通災害の防止に努めます。
- 杭頭はつり工事では騒音に配慮した作業方法を採用し、作業時間も8:00～17:00の間とします。
- 工事は低騒音型の機械を使用し、騒音に留意して作業を行います。
- 工事ゲートのガードマンにより、第三者が誤って現場内に入場しないよう管理します。
- 8月12日～8月16日を夏期休暇とし、この間は警備員を日中は常駐、夜間は巡回で事故防止に努めます。

【連絡先】 ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡下さい。
 前田・國場 建設工事共同企業体 伊武部ビーチ作業所
 (JV事務所) 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2198番地1
 TEL : 098-967-7455 FAX : 098-967-7457
 安全担当 : 窪田 琢郎 事務担当 : 後藤 正樹

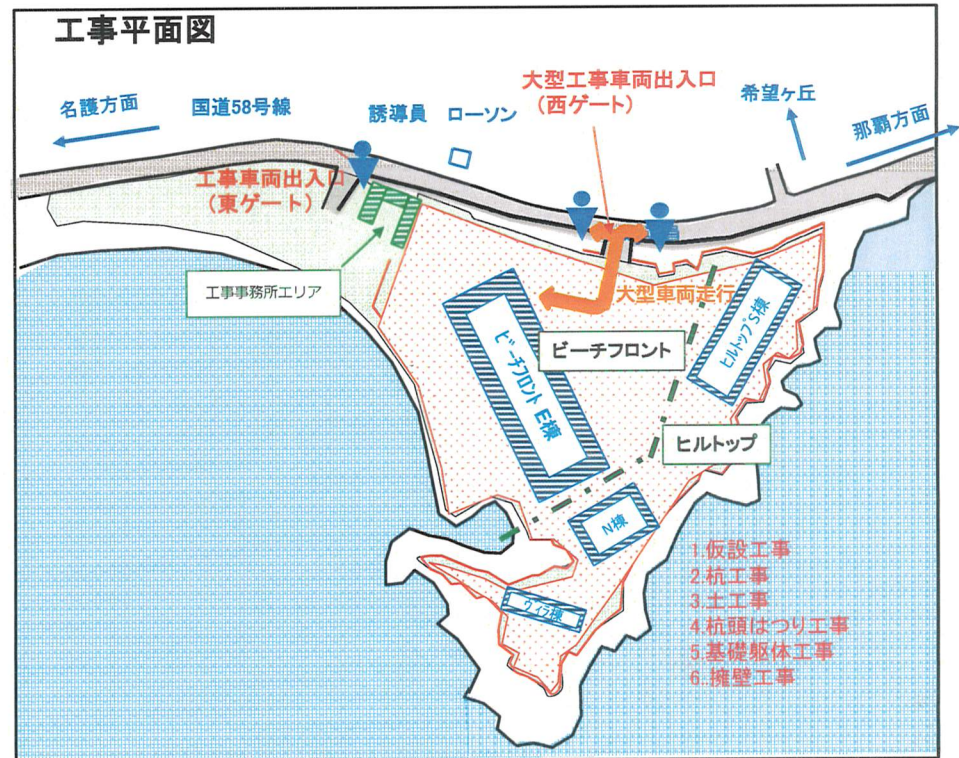

(仮称)沖縄伊武部ビーチホテル計画 平成29年9月の工事のお知らせ

工種	9月																														記事
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
1.【仮設工事】	ヒルトップS棟足場組立・解体・組み替え																														
2.【杭工事】																															
ビーチフロント E棟																															
ヒルトップ 連絡通路																															
3.【土工事】																															
4.【基礎躯体工事】																															
5.【擁壁工事】																															
搬入・その他																															

平成29年9月の工事についてのお知らせ


工事名称 : (仮称) 沖縄伊武部ビーチホテル計画
 工事場所 : 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真下袋原1967番地1外
 工事期間 : 平成29年4月1日～平成31年4月30日
 作業時間 : 原則として、午前8時～午後7時 (前後1時間は片付)

○前田・園場JVの9月の予定

- 9月の主な作業は、仮設工事、杭工事、土工事、杭頭はつり工事、基礎躯体工事、擁壁工事です。
 - ・9月25日～30日の夜間(22:00～03:00の間の1時間程度)に杭打機・副資材の搬出を行います。状況により時間に変更になることがあります。(搬入車両が特殊車両の為、行政指導により夜間しか走行出来ない為、夜間搬入となります。)
 - ・杭工事、基礎躯体工事、擁壁工事に伴い、大型車両による資材搬入が60～80台程度/日あります。
 - ・天候や工事の進捗により、工事内容や搬入日・車両・台数が変わることがあります。
 - ・熱中症対策で昼休憩を多くし、夕方の作業とする為、午後8時頃まで作業することがあります。
- 車両の搬出入は、ガードマンにより歩行者・一般車両を優先とした誘導と運転手への指導を徹底し、交通災害の防止に努めます。
- 杭頭はつり工事では騒音に配慮した作業方法を採用し、作業時間も8:00～17:00の間とします。
- 工事は低騒音型の機械を使用し、騒音に留意して作業を行います。
- 工事ゲートのガードマンにより、第三者が誤って現場内に入場しないよう管理します。
- 旧盆の9月5日は、現場全休とします。

【連絡先】 ご不明な点等がございましたら、下記までご連絡下さい。
 前田・園場 建設工事共同企業体 伊武部ビーチ作業所
 (JV事務所) 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真2198番地1
 TEL : 098-967-7455 FAX : 098-967-7457
 安全担当 : 窪田 琢郎 事務担当 : 後藤 正樹

工事平面図

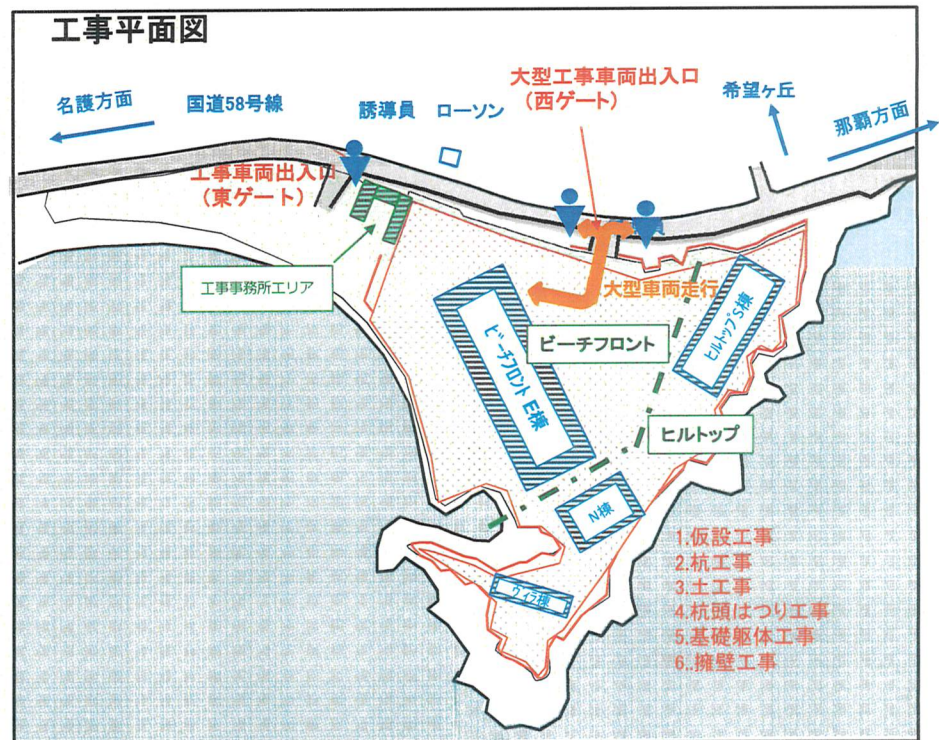



国定公園事業の内容の変更の許可申請書

沖縄海岸国定公園 宿舎 事業の執行の認可を受けた内容を変更したいので、自然公園法第16条4項で準用する同法第10条第6条第1項の規定に基づき、次のとおり申請します。

平成 29年 2月 14日

申請者
住所 沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真2198番地1
氏名 株式会社 ユーズリゾート沖縄
代表取締役 雀部 優

沖縄県知事 翁長 雄志 殿

執行の認可を受けた年月日及び番号		平成 19年 2月 23日 沖縄県指令文第57号 (新規許可)		
		平成 20年 7月 25日 沖縄県指令文第193号 (変更許可)		
		平成 28年 4月 14日 沖縄県指令環第61号 (変更許可)		
国定公園事業の種類		宿舎		
変更の内容	事項	変更前	変更後	
	公園施設の種類の	宿舎	変更なし	
	公園施設の位置	沖縄県国頭郡恩納村字名嘉真下袋原1967-1 外	変更なし	
	公園施設の規模・構造	事業区域	8.72 ha	変更なし
		客室数	360室	変更なし
		総建築面積	15,700 m ²	総建築面積 12,530.55 m ²
		総延床面積	44,985 m ² (内駐車場延床面積 2,800 m ²)	総延床面積 41,786.06 m ²
		階数	地上1, 2, 5, 10階建	地下1階 地上1, 2, 4, 5, 9, 10階建
	公園施設の管理又は経営方法	構造	鉄筋コンクリート造 ・鉄骨造・木造等	変更なし
		経営方法	直営	変更なし
料金徴収		あり	変更なし	
	供用期間	通年営業	変更なし	
変更をしようとする年月日		平成 29年 4月 1日 (但し、許可の日以降)		
工事施行の予定期間		平成 28年 9月 1日 着工	平成29年5月1日着工(許可の日以降)	
		平成 31年 3月 31日 完了	平成31年4月30日完了	
変更を必要とする理由		別紙による。		
備考				
